سرپرست شهرداری منطقه ثامن: مرمت بازار فرش تا دی‌ماه به‌پایان می‌رسد

بازار فرش به چله می‌رسد

گزارش خبری

محمد کاملان

بازار فرش که تنها تکه و یادگاری باقی مانده از بازار بزرگ شهر مشهد به حساب می‌آید به دستور شاهرخ تیموری ساخته شده است و روزگاری از صحن مسجد گوهرشاد آغاز می‌شد و تا میانه‌های کوچه سرشور ادامه داشت.

کم توجهی و عدم رسیدگی اصولی به بازار و بنای آن در سال‌های نه چندان دور باعث شده بود وضعیت بازار تاریخی فرش مشهد روز به روز وخیم‌تر شود، تا آنجا که سازمان آتش نشانی مشهد به صورت رسمی اعلام کرد که این بازار ناایمن است و هر لحظه امکان فروریختن سقف آن روی سر مردم و مالکان وجود دارد. اوضاع نامساعد ساختمان بازار و در خطر بودن جان مردم و نیاز ضروری به مرمت باعث شد شهرداری و میراث فرهنگی برسر مرمت و بهسازی بازار تاریخی فرش به توافق برسند و یک سال و اندی پیش مرمت این گذرگاه زنده اقتصادی را آغاز کنند، اما روند اجرای این پروژه مهم به دلیل تأمین مصالح سنتی، کمبود استادکار ماهر و البته همکاری نکردن برخی از مالکان با پروژه، کمی طولانی شد و همین موضوع در چند روز گذشته اعتراض برخی از کسبه را نیز به همراه داشت حالا آن طور که سرپرست شهرداری منطقه ثامن خبر داده، روند مرمت بازار تسریع شده است و دی ماه امسال بالاخره به بهره برداری خواهد رسید. در سال ۱۳۸۵ با موافقت سازمان میراث فرهنگی بازار فرش مشهد در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت و تقریبا همان زمان پرونده مرمت این بازار تاریخی باز شد. پرونده‌ای که البته به دلیل اختلافات جدی شهرداری مشهد و میراث فرهنگی استان بر سر نقشه‌های مرمتی و چگونگی اجرای مرمت بازار و برخی مشکلات دیگر خیلی زود بسته شد. اما فرسودگی شدید تیرهای چوبی سقف بازار و امکان فروریختن آن و اخطارهای متعدد آتش نشانی مبنی بر ناایمن بودن بازار فرش مشهد و در خطر بودن جان مردم و کسبه باعث شد شهرداری و میراث فرهنگی حدود دوازده سال بعد، در سال ۱۳۹۷ یک بار دیگر برای مرمت بازار فرش بر سر میز مذاکره بنشینند و این بار برخلاف آن سال به توافق برسند. کمتر از یک سال بعد هم ابلاغ کلی طرح مرمت بازار تاریخی فرش مشهد از تهران به مشهد رسید و پس از اجرای طرح مرمتی بر روی قسمت کوچکی از بازار و ارزیابی و تأیید کارشناسان و متخصصان میراث فرهنگی، طرح نهایی بهسازی و مرمت بازار فرش مشهد برای تأیید به میراث فرهنگی کشور ارسال شد و در خرداد ماه ۱۳۹۹ این طرح تصویب و به شهرداری مشهد ابلاغ شد.

از نبود استادکار ماهر تا تعلل برخی از کسبه

اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ که کلنگ مرمت بازار فرش مشهد به زمین خورد، شهردار وقت منطقه ثامن، گفت که پیمانکار پروژه، بازار فرش را باید تا آذرماه ۱۴۰۰ به شهرداری و مالکان تحویل بدهد. حدود چهار ماه پس از آغاز عملیات مرمت بازار فرش، یعنی شهریورماه، و در حالی که پروژه باید تا آذرماه به بهره برداری می‌رسید، مسئولان شهرداری منطقه ثامن اعلام کردند که مرمت بازار فقط ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و علت تأخیر و کندی اجرا هم معارضات زیاد و سنگین و تعلل برخی از کسبه در همکاری با شهرداری در اجرای پروژه مرمت بازار فرش است. البته ثبت ملی بودن بازار و هماهنگی با میراث فرهنگی برای کوچک‌ترین تغییرات نیز در طولانی شدن روند مرمت بازار بی تأثیر نبود. پایان سال ۱۴۰۰ وعده شهرداری منطقه ثامن برای پایان این عملیات عمرانی مهم شهری بود اما شهردار وقت منطقه ثامن، در آذرماه ۱۴۰۰ و در گفت‌وگو با خبرنگار شهرآرا، از همکاری نکردن و تعلل برخی از مالکان در مرمت بازار گلایه کرد و باز هم این اتفاق و البته معارضات و تأسیساتی را که از سطح زیرین بازار عبور کرده بود از عوامل کُند و طولانی شدن پروژه مرمت بازار فرش دانست و گفت که این کار تا پایان تابستان ۱۴۰۱ به اتمام خواهد رسید. البته علی عابدزاده، نماینده شهرداری منطقه ثامن در امور بازار فرش، ۲۶ فروردین ماه در گفت و گو با شهرآرا، یکی از معضلات اساسی مرمت بازار فرش را کمبود نیروی انسانی ماهر دانست و افزود: مرمت و بازسازی بازار فرش نیاز به استادکار سنتی ماهر دارد که در مشهد با کمبود نیروهایی از این دست روبه‌رو هستیم و برای حل این مسئله در کنار آموزش استادکاران محلی، با رایزنی‌های صورت گرفته گروه‌هایی از استادکاران سنتی شهرهای طبس، یزد و تبریز در اوایل سال جدید به استادکاران موجود اضافه خواهند شد. عابدزاده در ادامه وعده داد که اگر این مشکل حل و فصل شود، مرمت بازار فرش تا ابتدای مهرماه ۱۴۰۱ به اتمام می‌رسد.

پایان پروژه بازار فرش اولویت شهرداری منطقه ثامن باشد

اما روز گذشته و پس از اعتراض برخی از کسبه بازار فرش به طولانی شدن روند مرمت و بهسازی بازار، جلسه مشترکی میان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، سرپرست شهرداری منطقه ثامن و رئیس سازمان بازآفرینی شهرداری مشهد برای بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پروژه «احیا و نوسازی بازار فرش مشهد» برگزار شد.

حسن موحدیان، رئیس پارلمان شورای ششم در این جلسه با اشاره به طولانی شدن روند پروژه احیای بازار فرش گفت: طولانی شدن اجرای پروژه به دلیل برخی مسائل و مشکلات پیش آمده، نارضایتی برخی از کسبه را به همراه داشته است. یکی از کارهای مهم و اولویت‌های شهرداری منطقه ثامن، باید تکمیل پروژه احیای بازار فرش باشد تا مشکلات کسبه این بازار حل شود.

وی ادامه داد: بازار فرش یکی از قدیمی‌ترین بناهای تاریخی شهر مشهد مقدس است و در فهرست آثار ملی هم به ثبت رسیده است و به همین دلیل هر اقدامی در بازار که توسط شهرداری قرار است صورت بگیرد، باید با هماهنگی میراث فرهنگی انجام و اجرایی شود.

مرمت تا دی ماه به پایان می‌رسد

سرپرست شهرداری منطقه ثامن نیز با بیان اینکه پس از بازدید رئیس شورای شهر از بازار فرش در بهمن ماه سال ۱۴۰۰، روند پروژه مرمت و بازپیرایی سرعت بیشتری گرفته است تصریح کرد: پروژه بهسازی و مرمت بازار فرش علاوه بر احیای معماری اسلامی-ایرانی و ایجاد حس معنوی در زائران و مالکان و کسبه بازار، موجب رونق کسب و کار در این بازار خواهد شد و امیدواریم شهرداری و کسبه بازار اهتمام ویژه‌ای به تکمیل آن داشته باشند.

نصب تابلوی روزشمار

ساسان نورین مقدم با تأکید بر برنامه‌ریزی شهرداری برای تسریع و تکمیل مرمت و بهسازی بازار فرش گفت: تاکنون پروژه حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و براساس برنامه زمان‌بندی ارائه شده توسط سرپرست کارگاه، پیش‌بینی می‌شود که پروژه تا دی ماه امسال به اتمام برسد. منابع مالی مورد نیاز برای مرمت بازار فرش را تأمین می‌کنیم و برای اطلاع رسانی دقیق به کسبه و مالکان، تابلوی روزشمار بهره برداری را نیز نصب خواهیم کرد.

وی با اشاره به دلایل تأخیر اتمام این پروژه بیان کرد: یکی از دلایل کندی پیشرفت پروژه، تخصصی بودن مرمت این اثر تاریخی و نیاز آن به مصالح و نیروی انسانی خاص است.

عکس: داوود بهگام | شهرآرا

به‌گفته شهردار منطقه ۳ مشکل ترافیکی پل فجر تا امام حسین(ع) برطرف می‌شود

دوربرگردان ۱۰۰ میلیاردی در صدمتری

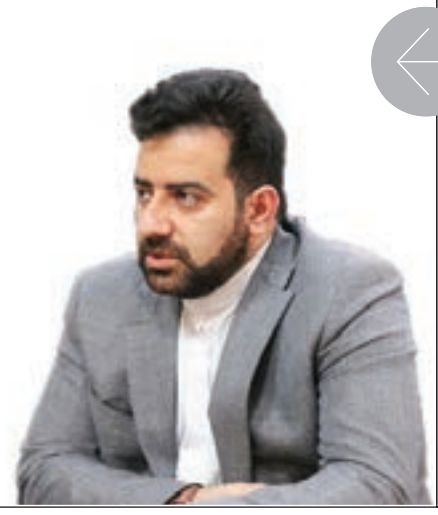

علیرضا ظهیری | دوربرگردان همسطح، حدفاصل تقاطع غیرهمسطح فجر و میدان امام حسین(ع) و در مجاورت پل رسالت در بیشتر ساعت‌های روز باعث ایجاد گره ترافیکی در بزرگراه شهید میرزایی یا همان صدمتری می‌شود، موضوعی که علاوه بر حادثه‌خیز کردن این منطقه سبب نارضایتی بسیاری از شهروندان شده است. از این رو مدیریت شهری مشهد درصدد است با ساخت یک دوربرگردان در مجاورت پل رسالت این مشکل را برای همیشه برطرف کند تا گره دیگری از گره‌های ترافیکی شهرمان در دوره ششم مدیریت شهری باز شود و بخشی از مشکل ساکنان مناطق این محدوده پس از سال‌ها رفع شود.

شهردار منطقه ۳ شهرداری مشهد با اعلام خبر آغاز عملیات ساخت دوربرگردان شهید میرزایی در بزرگراه صدمتری مشهد در سال جاری گفت: این پل در حدفاصل پل رسالت یا نوغان تا پل فجر احداث می‌شود و دو طرف بزرگراه صدمتری، از جنوب به شمال بزرگراه را به هم متصل می‌کند؛ پروژه‌ای که در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری مشهد قرار گرفته است و عملیات اجرای آن با اعتبار صد میلیارد تومانی به‌زودی آغاز می‌شود.

مهدی خداشناس افزود: مطالعات ساخت این دوربرگردان غیرهمسطح اکنون انجام و طرح آن نیز آماده شده است که به محض تخصیص اعتبار عملیات عمرانی نیز کلنگ خواهد خورد.

وی با اشاره به برخی معارضات برای ساخت این دوربرگردان غیرهمسطح بیان کرد: در مسیر ساخت این دوربرگردان دکل‌های فشار قوی برق وجود دارد که باید برای تبدیل آن‌ها به نوع تلسکوپی اقدامات لازم انجام شود.

خداشناس ادامه داد: همچنین براساس پیش‌بینی برای ساخت پل شهید میرزایی قرار است حدود ۱۲ هزار مترمکعب خاک برداری و پی کنی و هزار و ۸۰۰ مترحفاری ماشینی برای شمع انجام شود. وی با اشاره به استفاده از هزار تن میل گرد و اجرای ۶ هزار مترمکعب بتن درجا در این پروژه گفت: اجرای ۱۴۵ مترمکعب تیر پیش ساخته، ۷ هزار و ۶۰۰ مترمربع قالب بندی، اجرای ۲۸۰ مترمکعب پازل بتنی خاک مسلح، ۲۱۰ مترمکعب جدول پیش ساخته، هزار مترمربع تایل، ۷ هزار و ۵۰۰ مترمتال دک عرشه، هزار و ۲۰۰ مترمکعب زیراساس، هزار و ۲۰۰ مترمکعب اساس و اجرای عملیات آسفالت به میزان ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار تن از دیگر اقداماتی است که در این پروژه انجام می‌شود.

احداث دوربرگردان با سرعت بالا

شهردار منطقه ۳ با بیان اینکه طول این دوربرگردان غیرهمسطح ۷۰۰ متر است، اظهار کرد: به این دلیل که پروژه تملک خاصی ندارد پیش‌بینی می‌شود در صورت برخورد نکردن با دیگر معارضات احتمالی سرعت انجام پروژه بالا باشد. خداشناس اظهار کرد: با ساخت این دوربرگردان علاوه بر اینکه ترافیک ایجاد شده بزرگراه توسط دوربرگردان همسطح مجاور پل رسالت در حد زیادی کاهش می‌یابد، باعث ایمنی رفت و آمد شهروندان و افزایش رضایت‌مندی ساکنان منطقه رسالت و محلات مجاور خواهد شد.

خبر چین

لزوم طراحی سند مدون برای توسعه فناوری‌های ارتباطی

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد خواستار تدوین سندی برای توسعه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعات با محوریت مشهد شد. مهدی ناصحی در حاشیه بازدید از سازمان فاوای شهرداری گفت: باید افق بین المللی و سند مدونی برای توسعه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعات با محوریت مشهد تدوین شود که بی‌شک مورد استقبال کشورهای منطقه قرار خواهد گرفت و بازار خوبی در این کشورها برای آن وجود خواهد داشت. در این زمینه شورای اسلامی شهر مشهد نیز آماده هرگونه همکاری و ریل گذاری و مانع زدایی است و گام‌های حیاتی در این زمینه باید برداشته شود. وی تأکید کرد: سازمان فاوا ملزم است تمهیدات لازم برای راه اندازی نخستین مرکز پدافند سایبری کشور در مشهد و همچنین زیرساخت جامع اطلاعات مکانی، نرم افزار جمع آوری هوشمند پسماند خشک، نصب المان‌های تعاملی، کیوسک‌های هوشمند تعاملی و هوشمندسازی ایستگاه‌های پمپاژ را در دستور کار قرار دهد.

تور استانی دوچرخه‌سواری

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه تورهای دوچرخه‌سواری فرصت کم نظیری برای معرفی ظرفیت‌های مختلف شهرها محسوب می‌شوند گفت: درصدد هستیم که ۱۹ تیرماه برای نخستین بار در سطح استانی این تور را برگزار کنیم. به گفته مجید طهوریان عسکری رایزنی با فدراسیون دوچرخه‌سواری برای برگزاری تور دوچرخه‌سواری در قالب تور «جام ولایت» در سطح کشوری در حال انجام است. وی با اشاره به اینکه خلأ فعالیت تیم ورزشی در استان و مشهد به‌شدت حس می‌شود، ادامه داد: شهرداری مشهد و شرکت «بایدو» می‌تواند به‌صورت تخصصی به این حوزه ورود و شبکه تیم داری ایجاد کند تا افتخارآفرینی‌ها بیشتری متوجه مدیریت شهری و شرکت «بایدو» شود.

مرمت سرای عزیزا... اف سرعت می‌گیرد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی با تأکید بر تسریع در اجرای عملیات مرمتی سرای عزیزا... اف به تسنیم گفت: باید اقدامات اجرایی مرمت سرعت گیرد و عملیات مرمتی به‌صورت تمام وقت و بدون وقفه در این بناها تداوم داشته باشد. به گفته سید جواد موسوی با توجه به رانش‌هایی که در بنا به وجود آمده است، برای ایمنی و پیشگیری از آسیب به شهروندان اقدامات حفاظتی به صورت اضطراری انجام می‌شود.

تسریع در اجرای پروژه گیت عوارضی مشهد-باغچه

رئیس پلیس راه استان خراسان رضوی از اعلام آمادگی کامل این اداره برای همکاری با شهرداری در اجرای پروژه گیت اتوبان باغچه خبر داد. سرهنگ حسین میش مست در دیدار با شهردار منطقه ۷ با بیان اینکه جمع آوری گیت ورودی مشهد باغچه باید با کمترین تبعات انجام بگیرد گفت: باید همه موارد احتمالی بررسی شود تا با کمترین تبعات و ایمن ترین حالت طرح جمع آوری گیت عوارضی مشهد باغچه و نصب دوربین‌های پلاک خوان اجرایی شود. وحید برجسته نژاد، شهردار منطقه ۷، نیز در این باره تصریح کرد: این پروژه با هدف باز کردن گره ترافیکی و همچنین سهولت دسترسی شهروندان شهرک طرق و شهرک ابوذر که به محدوده شهری اضافه شده‌اند و همچنین تردد آسان‌تر شهروندان به مسیر بهشت رضا(ع) در حال انجام است.

عدد خبر

۹۰۰ رأی قلع‌بنا

مدیرکل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری مشهد از اجرای ۹۰۰ رأی قلع‌بنا در این کمیسیون از ابتدای سال خبر داد. مسعود ایاز در این باره گفت: از ابتدای امسال به ۴ هزار و ۵۲۰ پرونده در این کمیسیون رسیدگی شد که برای ۲۳ درصد از این تعداد رأی جریمه و برای ۲۰ درصد نیز رأی قلع صادر شد که از آرای قلع صادر شده فقط پنج درصد اجرا شده است. سال گذشته تخلف ۱۸ هزار مِلک در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مشهد بررسی، رسیدگی و از این تعداد برای ۳ هزار و ۱۰۰ ملک رأی تخریب صادر و هشت صد فقره از این تعداد اجرایی شد، بقیه موارد نیز در دست پیگیری است.

۱۰۰۰ تومان

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد با اشاره به اینکه بهای استفاده از اتوبوس با من کارت همچنان هزار تومان است، گفت: بهای نقدی خدمات اتوبوسرانی در شهر مشهد برای افرادی که از من کارت استفاده نکنند ۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است. به گفته علی اصغر نیشابوری تغییر تعرفه برای افرادی است که از من کارت استفاده نمی‌کنند. وی افزود: هم اکنون ۶ میلیون من کارت در اختیار شهروندان است و مشکلی برای تأمین من کارت نداریم و برای رفع کمبود مراکز شارژ، در صد نقطه شهر که پرتراکنش اند و مسافر بیشتری دارند، دستگاه‌های شارژ من کارت نصب خواهد شد.

۱۲۰۰ مترحفاری

با اعلام مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد، تاکنون هزار و ۲۰۰ متر از حفاری تونل خط ۴ انجام شده است. کیانوش کیامرز با بیان اینکه حفاری در این خط همچنان ادامه دارد تصریح کرد: همچنین خط ۳ نیز در مجموع به طول ۲۸,۵ کیلومتر طولانی‌ترین خط مترو مشهد است که از انتهای امیریه تا شهرک ابوذر امتداد دارد و بیش از هفده کیلومتر از تونل خط ۳ به وسیله دستگاه حفار اجرا شده است و ۱۱,۵ کیلومتر باقی مانده از تونل این خط نیز از دو جبهه در حال اجراست و روزانه حدود ۱۰-۱۲ متر حفاری انجام می‌شود.

۱۱۶ هزار متر لای‌روبی

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد با اعلام لای‌روبی بیش از ۱۱۶ هزار متر از کانال‌های جمع آوری آب‌های سطحی در سه ماهه نخست امسال گفت: بیش از ۸۶ درصد از کانال‌ها در فصل بهار به صورت کاملا مکانیزه لای‌روبی شده‌اند. به گفته سید محسن رهنمایی بیشترین میزان لای‌روبی به ترتیب در مناطق ۳، ثامن و ۷ صورت گرفته است.

آگهی مناقصه عمومی
شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۱۰۹۴۹۹۹۰۰۰۰۰۷
موضوع: بازسازی و بهسازی پیاده رو و اصلاح جوی و جدول گلشهر
مبلغ برآورد: ۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید.
این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir نیز درج می گردد.
امور قراردادها و پیمان های شهرداری منطقه

آگهی مناقصه عمومی
شماره فراخوان ۰۶ ۲۰۰۱۰۹۴۹۳۶۰۰۰۰۰۶
موضوع : بکارگیری ۶ دستگاه خودرو مزدا دوکابین با راننده جهت برخورد با بازیافت کنندگان غیرمجاز در سطح شهر
مبلغ برآورد : ۱۵,۷۶۸,۰۰۸,۶۴۰ ریال
جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir نیز درج می گردد.
سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد

ردیف	شماره مناقصه	آگهی مناقصه عمومی
۱	۷/۱۴۰۱/۱۳	شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۱۰۹۵۰۰۰۰۰۰۰۱۳ موضوع : اجرای بهسازی معبر ثامن الائمه (باز آفرینی - زودبازده) مبلغ برآورد: ۱۰,۷۲۹,۱۴۶,۸۳۵ ریال جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir نیز درج می گردد.

امور قراردادها و پیمان های شهرداری منطقه ۷

ردیف	شماره مناقصه	آگهی مناقصه عمومی
۱	۷/۱۴۰۱/۱۲	شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۱۰۹۵۰۰۰۰۰۰۰۱۲ موضوع : اجرای بهسازی معبر ثامن الائمه (باز آفرینی - زودبازده) مبلغ برآورد: ۱۴۵,۳۵۳,۴۴۲,۶۵۵ ریال جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir نیز درج می گردد.

امور قراردادها و پیمان های شهرداری منطقه ۷

ردیف	شماره مناقصه	آگهی مناقصه عمومی
۱	۷/۱۴۰۱/۱۱	شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۱۰۹۵۰۰۰۰۰۰۰۱۱ موضوع : بازپیرایی و اجرای سیستم روشنایی پارک سپیده و محله انقلاب (باز آفرینی - زودبازده) مبلغ برآورد: ۱۵,۶۸۴,۷۱۶,۸۶۰ ریال جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir نیز درج می گردد.

امور قراردادها و پیمان های شهرداری منطقه ۷

ردیف	شماره مناقصه	آگهی مناقصه عمومی
۱	۱۰/۱۴۰۱/۸۴۰۵	شماره فراخوان سامانه ستاد: ۲۰۰۱۰۹۵۰۰۲۰۰۰۰۰۰۲ موضوع : تعویض و بازسازی جوی و جدول کانیو آبهای سطحی محله خاتم الانبیا(ع) مبلغ برآورد اولیه ۱۲,۵۹۵,۸۲۲,۷۸۷ ریال جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir نیز درج می گردد.

امور قراردادها و پیمان های منطقه ده شهرداری مشهد

آگهی مناقصه عمومی
شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۱۰۹۴۹۹۹۰۰۰۰۰۸
موضوع : بهسازی پیاده رو و اصلاح جوی و جدول کوی امیرالمومنین (ع)
مبلغ برآورد: ۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید.
این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir نیز درج می گردد.
امور قراردادها و پیمان های شهرداری منطقه
